

REGISTRO GENERALE N. 573In data 23/12/2021**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICAI 263/SUB 5**DETERMINAZIONE N. 229 DEL 23/12/2021**

CIG: 865445495D

CUP: H88H20000280004

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI FINE LAVORI, REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021 esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati e ss.mm.ii.;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021 e ss.mm.ii.;
- Che allegate al PEG sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2021, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2021/2023 come sopra indicate;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 43 del 30/03/2021 con la quale si affidavano i lavori di cui all'oggetto della presente determinazione alla ditta Edilaccinelli SNC di Varazze (SV) a seguito di gara espletata sul Mepa con RDO n. 2765247;
- la determinazione n. 92 del 25/06/2021 con la quale si impegnava la somma di Euro 29.021,17 iva compresa per lavori di completamento del campo sportivo comunale;
- la determinazione n. 111 del 21/07/2021 con la quale si approvava il 1° SAL ed il certificato di pagamento n. 1 di importo pari a Euro 21.106,60 oltre iva per i lavori di completamento del campo sportivo comunale;

VISTO che il direttore dei lavori Geom. Franco Taretto, con prot. n. 8938 del 23/12/2021, ha provveduto alla trasmissione della seguente documentazione:

- certificato di ultimazione lavori al 04/12/2021;
- certificato di regolare esecuzione;
- certificato di pagamento finale pari Euro 5.276,58 oltre Iva al 10% pari a Euro 5.804,24;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di approvare la seguente documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Franco Taretto relativamente ai lavori di completamento del campo sportivo di cui alla presente determinazione:
 - certificato di ultimazione lavori al 04/12/2021;
 - certificato di regolare esecuzione;
 - certificato di pagamento finale pari Euro 5.276,58 oltre Iva al 10% pari a Euro 5.804,24;
- 2) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo CAP. 3406/1;
- 3) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 4) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;

Altare, 23/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Tiziana Reale



COMUNE DI ALTARE
PROVINCIA DI SAVONA

Oggetto: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "S. FORNACIARI", REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE ED OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI DI COMPLETAMENTO.

Impresa: EDILACCINELLI S.n.c - Via Montegrappa 7 - 17019 - VARAZZE (SV) - codice fiscale e partita I.V.A. 01607150099

Contratto d'Appalto Determina n. 92 del 25 giugno 2021

Importo a base di contratto: € 26.382,88 oltre I.V.A. di legge

IMPORTO CONTRATTUALE: prezzo globale per l'esecuzione dei lavori di € 36.042,18 per il conseguente ribasso percentuale del **26,80%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 26.382,88** oltre IVA di legge

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

PREMESSO CHE

In data **25.06.21** con Determina n° 92 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa EDILACCINELLI S.n.c. per il prezzo complessivo di **€ 36.042,18**, avendo offerto un ribasso percentuale del **26,80%**, corrispondente al valore contrattuale di **€ 26.382,88** (importi al netto di I.V.A.).

In data **25.06.21** sono stati **consegnati i lavori**, per una durata di **giorni 120** (centoventi) lavorativi, che dovevano quindi concludersi in data **15.12.21**.

PRESO ATTO che

In data **05.12.21** l'impresa comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data **04.12.21**,

l'anno 2021, il giorno 06 del mese di dicembre, il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso all'impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo in cui si sono eseguiti i lavori dove ha rinvenuto il **sig. Myftari Klodian**, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa **EDILACCINELLI S.n.c.** ed ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri in contraddittorio con l'Appaltatore. Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e successive varianti e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 04.12.21 e, pertanto, in tempo utile.

Altare, 18 dicembre 2021

l'Impresa

(sug. Klodian Myftari)

EdilAccinelli s.r.l.
P.I. e C.F. 01607150099

il Direttore dei Lavori

(geom. Franco Taretto)



visto

il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Tiziana Reale)



COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA

Oggetto: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "S. FORNACIARI", REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE ED OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI DI COMPLETAMENTO.

Impresa: EDILACCINELLI S.n.c. - Via Montegrappa 7 - 17019 - VARAZZE (SV) - codice fiscale e partita I.V.A. 01607150099

Contratto d'Appalto determina n° 92 del 25 giugno 2021
Importo a base di contratto: € 26.382,88 oltre I.V.A. di legge

IMPORTO CONTRATTUALE: prezzo globale per l'esecuzione dei lavori di € 36.042,18 per il conseguente ribasso percentuale del **26,80%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 26.382,88** oltre IVA di legge

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04 dicembre 2021 è intervenuto oltre al sottoscritto progettista dell'opera e direttore dei lavori geom. Franco Taretto ed il Sig. Klodian Myftari nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice.

Sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati in conformità al progetto previsto.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie opere, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate negli elaborati di progetto e nello stato finale dei lavori allegato al presente dove sono state specificate le quantità finali con le variazioni delle opere realizzate e dei materiali utilizzati.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

- Che i lavori corrispondono totalmente alle previsioni della perizia;

- Che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere eseguite risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- Che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- Che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- Che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili,
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- Che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserva;

CERTIFICA

Che i lavori di "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "S. FORNACIARI", REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA NATURALE ED OPERE COMPLEMENTARI, LAVORI DI COMPLETAMENTO", eseguiti dall'impresa EDILACCINELLI S.n.c., con sede in via Montegrappa 7 – 17019 – Varazze (SV) in base all'affidamento di cui Determinazione n° 92 del 25/06/2021, **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI.**

Redatto in unico originale, letto confermato e sottoscritto.

Altare, 05 dicembre 2021

l'Impresa
(sug. Klodian Myftari)

EdilAccinelli s.r.l.
P.I. e C.F. 01607150099

il Direttore dei Lavori
(geom. Franco Taretto)

visto
il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Tiziana Reale)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Art. 7 Decreto 22 gennaio 2008, n° 37

Ns. rif. Comm. **D754.21.1**

Il sottoscritto DAVIDE VENTURINO legale rappresentante dell'impresa TECNOELETTRA S.R.L. operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI con sede in Loc. Vetriera 12 A, 12B Stella San Giovanni 17044 (Sv) (tel.019-483865) - cod. fisc./part.IVA 00323150094 Iscritta nel Registro delle Ditte della C.C.I.A.A. di Savona al n. 71554

Esecutrice dell'impianto: **ELETTRICO di illuminazione, aggiunta di n. 3 proiettori LED nel progetto di riqualificazione impianto sportivo comunale S. Fornaciari (opere accessorie)**

Inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria

Commissionato da: **Edilacinielli**

Installato presso **NUOVO Campetto sportivo di allenamento Comunale S. Fornaciari N.C.T. foglio di mappa 6 particelle 40 e 182**

Di proprietà **Comune di Altare**

ad uso **civile**

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto ai sensi dell'art. 5 (2)
- seguito la normativa **tecnica** applicabile all'impiego (3) CEI 64-8, CEI17-13/1, CEI 23/51, CEI 81/10 ed edizioni successive
- installati componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) redatto da studio tecnico geom. Taretto Franco Via Roma 19/r Altare (Sv)**
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati (5)**
- schema di impianto realizzato (6):**
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)**
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali**
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)**

Allegati facoltativi (9):

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

06.12.2021

Per. Ind. Davide Venturino

Per. Ind. Davide Venturino

TECNOELETTRA s.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI
Loc. Vetriera 12A-12B
17044 STELLA S. GIOVANNI (SV)
C.C.I.A.A. SAVONA (71554)
C.F. e P.IVA: 00323150094

TECNOELETTRA s.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI
Loc. Vetriera 12A-12B
17044 STELLA S. GIOVANNI (SV)
C.C.I.A.A. SAVONA (71554)
C.F. e P.IVA: 00323150094


AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

Legenda:

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto o fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- 9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Relazione tecnica: Illuminazione campo calcio (allenamento) – Altare


- 1) Installazione di n. 3 proiettori RODIO 1887 LED 118W CLD GRAF sulla struttura che sorregge la griglia di recinzione del campo sportivo principale (segnati in rosso sul disegno).
- 2) Fornitura e posa di linea di alimentazione in cavo di FG16OR 3x2,5 mmq
- 3) Fornitura e posa di interruttore di protezione Schneider 2x10 A Id 0,03 A nel quadro elettrico di accensione

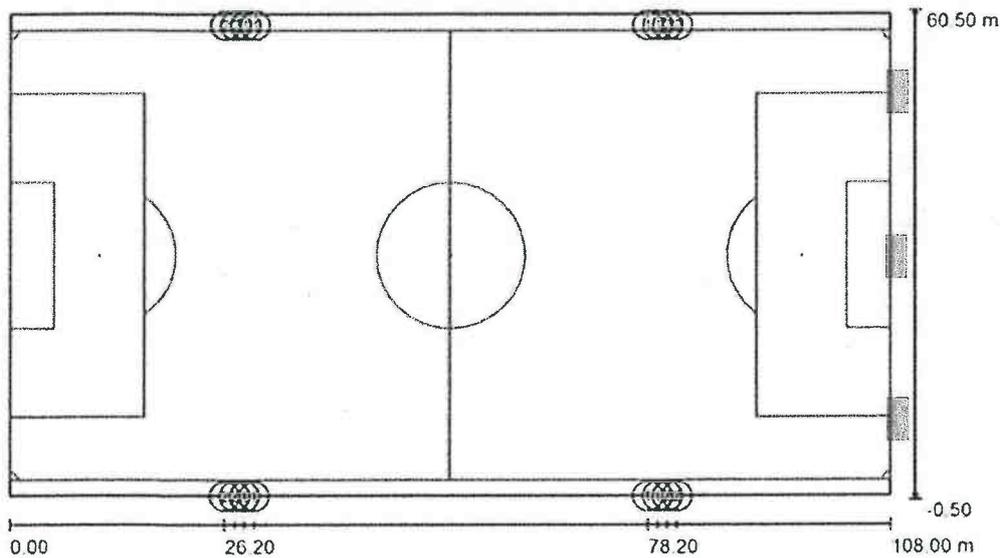




Download

- XF 2D
- 1887i.dxf
- DS
- disano_1887_rodio_24_led_3dm
- disano_1887_rodio_36_led_3dm
- DM
- disano_1887_rodio_24_led_3dm
- disano_1887_rodio_36_led_3dm
- Montaggi
- rodio 06-20.pdf
- IMA
- 1887 Rodio LED - asymmetric - 0200528.zip

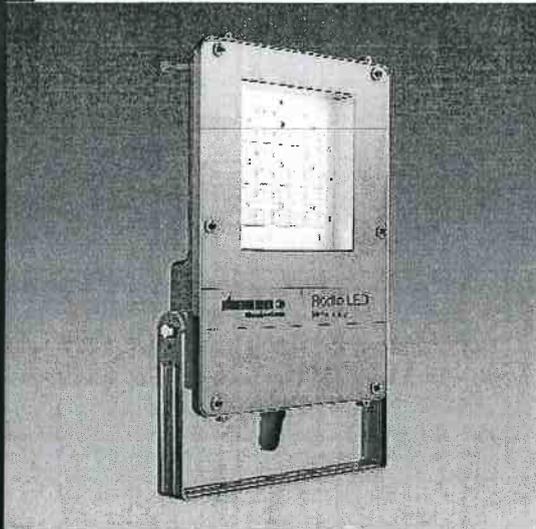

1887 Rodio LED - asimmetrico

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
 Riflettore: in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e a raggi UV.
 Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
 Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
 Dotazione: connettore esterno per una rapida installazione. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria.
 Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell'apparecchio se quest'ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta protezione fino a 10KV. verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227
 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi. Fattore di potenza: $\geq 0,9$
 low flicker
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20)
 Superficie di esposizione al vento: L:390cm² F:1420cm².
 Versione speciale (con trattamento di conformal coating con sottocodice -38, ad elevata resistenza chimica per ambienti con un alto grado di concentrazione di cloro.

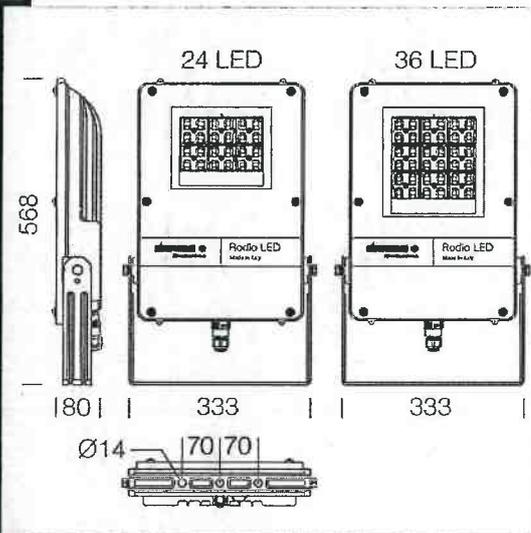

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore	Surge
414754-00	CLD	5.99	LED-6874lm-4000K-45°-CRI 80	53 W	GRAFITE	6/8kV
414755-00	CLD	5.99	LED-9210lm-4000K-45°-CRI 80	79 W	GRAFITE	6/8kV
414756-00	CLD	6.17	LED-13448lm-4000K-45°-CRI 80	118 W	GRAFITE	6/8kV
414752-00	CLD	5.81	LED-13392lm-4000K-55°-CRI 80	118 W	GRAFITE	6/8kV
414757-00	CLD	6.09	LED-16843lm-4000K-45°-CRI 80	157 W	GRAFITE	4/8kV
414753-00	CLD	6.17	LED-16424lm-4000K-55°-CRI 80	157 W	GRAFITE	4/8kV

Accessori



- 333 Attacco palo diam.60



- 334 Attacco palo diam. 76



- 350 gabbia di protezione

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_30403087	Data richiesta	30/11/2021	Scadenza validità	30/03/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILACCINELLI SRL
Codice fiscale	01607150099
Sede legale	VIA MONTEGRAPPA, 7/1 17019 VARAZZE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

Certificato di pubblicazione AL n _____/2021

La presente determinazione , al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta
